



RevolutionX

PORFOLIO DE EMPRESA

GESTIÓN DE PROYECTOS

PATROCINIO Y MARKETING

REVOLUTIONX


STEM RACING · TEMPORADA 2025/2026 · IES JOSÉ SARAMAGO

"DRIVEN BY PURPOSE, DEFINED BY SUCCESS"

IDENTIDAD DE MARCA



UNIFORMES



PÁGINA WEB



INSTAGRAM



CROWDFUNDING





ÍNDICE DEL PORFOLIO

- Pág. 2 — Iniciación
- Pág. 3 — Alcance, WBS y cronograma
- Pág. 4 — Presupuesto y recursos
- Pág. 5 — Roles y responsabilidades
- Pág. 6 — RACI y comunicación
- Pág. 7 — Riesgos y monitoreo
- Pág. 8 — Identidad de marca
- Pág. 9 — Marketing y ejecución
- Pág. 10 — Patrocinio, prensa y crowdfunding

Preguntas WH

- ¿Quiénes somos? Somos RevolutionX, un equipo de la competición STEM Racing. Somos alumnos de 4º y 3º ESO del instituto IES José Saramago de Majadahonda.
- ¿Por qué queremos competir en STEM Racing? Porque tras nuestro primer año en esta competición, nos dimos cuenta de que nos apasiona. Además, queremos superarnos respecto al año pasado.
- ¿Qué tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos? Tenemos que entregar dos portafolios, elaborar una presentación verbal y, lo más importante, diseñar y fabricar un coche que correrá sobre una pista de 20m.
- ¿Cuándo empezaremos a trabajar en este proyecto? Nada más después de la temporada 2024/25, cuanto más tiempo tengamos, más preparados estaremos para cualquier adversidad.
- ¿Dónde podremos ver si nuestros objetivos se han cumplido? El primer paso serán las finales regionales de Madrid, donde aspiraremos a ser los mejores equipos de nuestra Comunidad Autónoma para cumplir nuestro objetivo de clasificar a las finales nacionales de España.

¿CÓMO NOS VISUALIZAMOS?

Nos vemos como un equipo que ha elaborado su identidad de marca y ha aumentado su visibilidad, con uno de los coches más rápidos de la categoría.

KICK OFF MEETING

20 DE JUNIO DE 2025

El 20 de junio de 2025, RevolutionX tuvo su primera reunión de cara a la temporada 2025/2026. Es importante tener en cuenta saber en qué contexto se tuvo esta reunión, ya que veníamos de que el día anterior quedásemos segundos de la categoría Entry en las finales nacionales de España, donde, además, conseguimos el coche más rápido de la categoría.

Los sentimientos que teníamos todos los participantes del equipo en esa temporada eran agridulces. Nuestra felicidad era obvia, habíamos quedado como el segundo mejor equipo del país en nuestra categoría con el coche más rápido, sin embargo, todo el equipo sentía que podíamos llegar a más, teníamos claro que la temporada siguiente íbamos a apuntar a lo más alto, íbamos a intentar clasificar a las finales nacionales en la categoría Professional.

Una vez tuvimos claro cuál iba a ser nuestra categoría para la temporada 2025/26, tocó hacer el primer paso de cualquier proyecto, responder a las preguntas WH (Who, Why, What, When, Where, How). Así es como respondimos a todas estas preguntas.

CARTA DEL PROYECTO

La carta de proyecto es un documento formal que marca el punto de partida oficial de cualquier proyecto. En ella se recoge, de manera concisa y estructurada, toda la información esencial que lo define: su propósito, sus objetivos, los hitos principales, los responsables, las limitaciones y los riesgos previstos.

Su función principal es la de servir como acuerdo de partida entre todos los involucrados, dejando por escrito qué se va a hacer, por qué y quién lo va a llevar a cabo. De esta manera, todos los miembros del equipo parten de una misma base de entendimiento, evitando malentendidos o desviaciones a lo largo del proceso.

La importancia de la carta de proyecto reside en varios aspectos clave. En primer lugar, otorga dirección y claridad, ya que, al definir los objetivos y la justificación del proyecto desde el inicio, el equipo sabe exactamente hacia dónde se dirige y cuáles son sus motivaciones.

En segundo lugar, anticipa los problemas, ya que identificar desde el principio las limitaciones y los riesgos permite al equipo estar preparado y tomar medidas preventivas antes de que estos se conviertan en obstáculos reales.

CLAVES DEL PROYECTO

PROFESSIONAL

MADRID

2025/2026

STEM RACING

BRÚJULA DEL PROYECTO

En definitiva, la carta de proyecto es la brújula que guía al equipo desde el inicio hasta la conclusión del proyecto, garantizando que todos trabajan de manera alineada hacia un mismo fin.



ALCANCE, WBS Y CRONOGRAMA



DECLARACIÓN DE ALCANCE

La declaración de alcance es un documento el cual todo proyecto tiene que hacer para determinar hasta dónde puede llegar un proyecto y, que está en mano del equipo para cumplir su objetivo.

DISEÑO DEL COCHE

FABRICACIÓN

BÚSQUEDA DE FONDOS

PORFOLIO EMPRESA

PORFOLIO INGENIERÍA

REDES SOCIALES

UNIFORME

Declaración de alcance — RevolutionX		
Coordinadores	RESPONSABLES Saúl Morán - Martín Cendra	PERÍODO Sep 2025 - Dic 2025
Objetivo	Clasificar a las finales nacionales de España 2026	
Alcance	A NUESTRO ALCANCE - Entrega de tareas - Adquisición de fondos FUERA DE ALCANCE - Tiempo de trabajo en el Instituto - Recursos fundamentales (espacio, maquinaria...)	
Criterios de aceptación	Las tareas serán aceptadas una vez que el jefe del departamento correspondiente otorgue su aprobación formal.	
Tareas	Diseño del coche Fabricación Búsqueda de fondos Portfolio empresa Portfolio ingeniería Redes sociales Uniforme	
Limitaciones	— Presupuesto aproximado: 1.000 € — Tiempo de trabajo: ~9 meses — Equipo: 6 miembros + 2 ayudantes — Tiempo en el Instituto limitado	

Work Breakdown Structure (WBS)

El WBS (Work Breakdown Structure), también llamado EDT (Estructura de Desglose de Trabajo), es una técnica que ayuda a entender las fases que ha tenido cada tarea que se ha realizado. Este es el WBS del equipo de las tareas más importantes realizadas:

INGENIERÍA

- Coche: Conceptualización – Sketch – Modelado 3D – Testing – Refinamiento – Manufactura
- Túnel de viento: Conceptualización - Estructuración del diseño - Modelado 3D - Impresión por piezas - Unión de piezas
- Porfolio técnico: Conceptualización - Sketch - Refinamiento - Gráficos - Refinamiento final

GESTIÓN DE EMPRESA

- Prospecto de patrocinio: Conceptualización - Sketch – Refinamiento
- Alianza Internacional (Nova Alliance): Colaboración (Owla) - Estrategia – Contacto - Publicación
- Uniformes: Conceptualización - Prototipado – Refinamiento – Manufactura
- Pit Display: Brain Storming – Prototipado - Análisis de referentes – Refinamiento

Cronograma

El cronograma de organización ha sido una parte clave para el desarrollo y la organización de RevolutionX, el cual hemos ido actualizando aproximadamente cada mes para conseguir una organización constante.

Nuestro cronograma se ha basado en un diagrama de Gantt, que hemos hecho en Excel y con la ayuda de otra aplicación llamada ClickUp. Un diagrama de Gantt es un gráfico estructurado que muestra fechas de principio, fin y duración de un proyecto en concreto.

Inicialmente, hemos rellenado el cronograma con proyectos generales y de largo plazo (ej: diseño del primer prototipo del coche, búsqueda de patrocinadores, etc.). A continuación, detallamos más estas tareas, subdividiéndolas en tareas más concretas.

Después, cuando todas las tareas estaban asignadas con sus respectivas fechas, nos ceñimos a éstas, cumpliendo con las fechas lo mejor que pudimos. Finalmente, refinamos el cronograma para adjuntarlo en el porfolio.

Número del proyecto: 10784-Pit-2025-0008

Nombre del equipo: RevolutionX

Fecha: 21 de junio de 2025

Coordinadores del equipo: Saúl Morán y Martín Cendra

Administradores: Saúl Morán, Martín Cendra, Martín Cendra, Víctor Jiménez, Iago Álvarez y Álvaro Carreira

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Challenge es un proyecto de ingeniería dentro de la categoría 10784-Pit, donde se diseñará y fabricará un coche de competición para competir en el campeonato de España de 2026. El equipo deberá presentar un coche de competición en el campeonato de España de 2026, el cual deberá cumplir con los requisitos de la categoría 10784-Pit, el cual deberá ser capaz de competir en el campeonato de España de 2026.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El equipo RevolutionX afronta esta temporada con un doble propósito. Por un lado, la participación en 10784-Pit, donde se diseñará y fabricará un coche de competición para competir en el campeonato de España de 2026. Por otro lado, el equipo quiere el reto de superar los resultados obtenidos en la temporada anterior, estableciendo un nivel de exigencia más alto y una mayor ambición competitiva.

MTOS PRINCIPALES

Item	Fecha estimada
Inicio del proyecto	Septiembre de 2025
Fin del proyecto	Septiembre de 2026
Inicio de la competición	Septiembre de 2026
Fin de la competición	Septiembre de 2026

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Cada tarea será considerada concluida y aceptada únicamente cuando el coordinador del equipo con responsabilidad de la tarea haya firmado la hoja de entrega y ésta sea válida en todos los aspectos, garantizando así la máxima de calidad establecida por el equipo.

SUPOSICIONES Y RIESGOS

Se supone que el nivel competitivo en la categoría profesional de la categoría 10784-Pit será considerablemente elevado. En consecuencia, el equipo deberá tener en cuenta los riesgos de los competidores que se enfrentarán a los retos de la categoría, así como los riesgos de la competencia y para la entrega de la entrega por el equipo de la categoría.

LIMITACIONES

La principal limitación del equipo es la disponibilidad de los recursos dentro del equipo. Los recursos humanos y materiales son limitados y el equipo, al no tener un presupuesto suficiente para cubrir los gastos de la categoría, el equipo deberá tener en cuenta los riesgos de los competidores que se enfrentarán a los retos de la categoría, así como los riesgos de la competencia y para la entrega de la entrega por el equipo de la categoría.

RIESGOS

Se han identificado los riesgos principales que pueden comprometer el éxito del equipo. El primer riesgo es la falta de recursos humanos y materiales, lo que puede afectar al equipo en la entrega de la categoría. El segundo riesgo es la falta de recursos humanos y materiales, lo que puede afectar al equipo en la entrega de la categoría. El tercer riesgo es la falta de recursos humanos y materiales, lo que puede afectar al equipo en la entrega de la categoría.

El presente documento ha sido revisado y aprobado por los allegados, quienes asumen la responsabilidad de ver por el cumplimiento de la categoría.

Saúl Morán – Coordinador del equipo

Martín Cendra – Coordinador del equipo

RevolutionX-10784-Pit-2025-0008

Gestión de recursos

La gestión de recursos es clave a la hora de distribuir bien todo el dinero y material que tienes. RevolutionX vio elementos fundamentales en los que gastar la gran cantidad de los recursos: el Pit Display, y la fabricación del coche en CNC.

SEGUIMIENTO DEL GASTO PRESUPUESTARIO (BASE VS ORIGINAL)

Al comenzar el proyecto, el coordinador del sector de gestión de empresa hizo una estimación de que presupuesto necesitábamos para poder comprar todo lo que queríamos. Se estimó que necesitábamos un alrededor de 1000€ para poder costear todo.

Cuando a base de Sponsors y el Crowdfunding logramos llegar a esas cifras, hicimos una búsqueda aguda sobre todo lo que queríamos comprar. Las estimaciones fueron correctas, el precio total de todos los elementos que compramos de cara a la competición ha sido de 1033€.

FONDOS DE PATROCINIO FINANCIERO

ORIGEN	VALOR
Crowdfding	625 €
Pañalón	250 €
Lorena Solutions	140 €
Moñita	100 €
Titanes	85 €
El Postrecito de Isabel	50 €
Total	1.250 €

Patrocinio material y gastos


FONDO DE PATROCINIO MATERIAL

PATROCINADOR	APORTACIÓN
Black and White	10 camisetas + 2 roll-ups
Ayto Majadahonda	1 roll-up
Total	10 camisetas + 3 roll-ups

GASTOS

MATERIAL COMPRADO	COSTE	FUENTE DEL DINERO
4 Carteles Pit Display	380 €	Crowdfding
Cartel Nova Alliance	17 €	Crowdfding
Cartel grande frontal	26 €	Crowdfding
Maletín Coche	30 €	Pañalón
Rodamientos	30 €	Pañalón
Túnel de viento	140 €	Lorena Solutions
Impresión coche CNC	250 €	Crowdfding
Estampado camisetas	80 €	Titanes
Sprays	20 €	Pañalón
Pegatinas	10 €	Crowdfding
Tarta competición	50 €	El Postrecito de Isabel
Total	1.033 €	

Documento de referencia

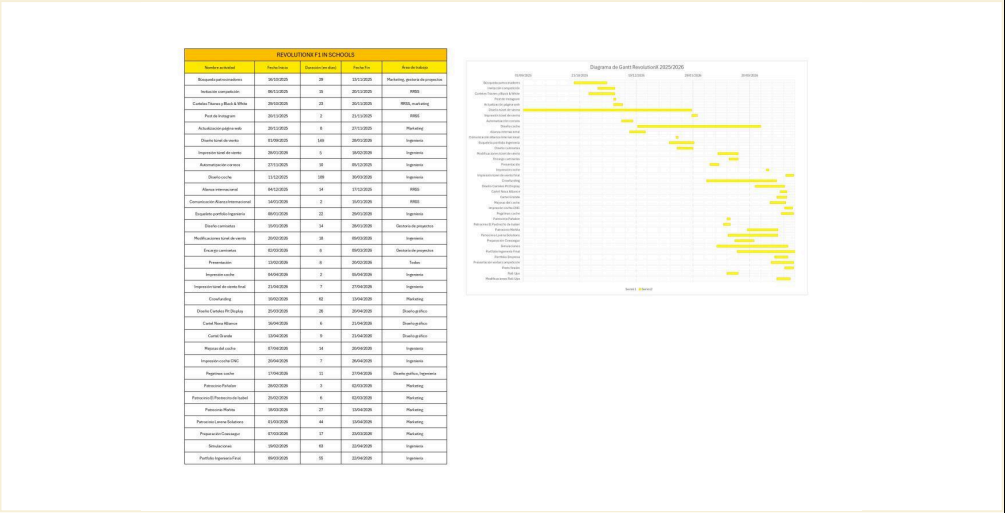

Este seguimiento económico muestra el presupuesto logrado por el equipo y cómo se distribuyó en elementos de competición, fabricación, comunicación y presentación.

- Elementos fundamentales en los que gastar la gran cantidad de los recursos: el Pit Display, y la fabricación del coche en CNC.
- Las estimaciones fueron correctas.
- El precio total de todos los elementos que compramos de cara a la competición ha sido de 1033€.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Estructura del equipo

Una de las tareas más duras que tuvimos nada más empezar, fue la de buscar sustitutos a los compañeros que no querían continuar con este proyecto, sin embargo, conseguimos estructurar el equipo consiguiendo un equilibrio perfecto entre ingenieros y responsables de la gestión de empresa.

Una de las claves en nuestro gran funcionamiento como equipo ha sido la de designar a 2 jefes/coordinadores de proyectos, ya que esto nos ha permitido tener más orden, teniendo un gestor de equipo más focalizado en el sector de la ingeniería y coordinador en la gestión de la empresa.

En fundamental recalcar, que nuestro equipo está dotado de alumnos muy polivalentes, eso nos hace poder trabajar hombro con hombro. Además, hemos tenido la suerte de tener la ayuda de alumnos, que aun sabiendo que no iban a poder participar oficialmente en la competición ya que todos los roles estaban asignados, estos se ofrecieron a colaborar con nosotros de manera voluntaria.

MIEMBRO	ROL
Saúl Morán	Coordinador del equipo
Martín Cendra	Gestor del equipo
Martina Corredor	Estrategia, ingeniería & relaciones externas
Víctor Jiménez	Ingeniero de diseño
Yago Álvarez	Comunicación & RRSS
Álvaro Cardona	Ingeniero de fabricación
Claudia de Paz	Ayudante en gestión de empresa
Ibrahim Aharrar	Ayudante en Ingieniería

Habilidades y conocimientos

MIEMBRO	HABILIDADES	CONOCIMIENTOS
Saúl Morán	Excel, Canva, GIMP, Click Up.	
Martín Cendra	Fusion360, Antigravity, Visual Studio Code.	Uso de IA, programación, ingeniería.
Martina Corredor	Canva, Ansys, Prezi	Diseño gráfico, comunicación, ingeniería
Víctor Jiménez	Fusion360, DaVinci Resolve.	Ingeniería, aerodinámica, impresión 3d
Yago Álvarez	BeFunky, Instagram, Prezi, Canva, CapCut.	Comunicación, diseño gráfico, edición de vídeos
Álvaro Cardona	Fusion360, Ansys, Blender.	Aerodinámica, simulación, impresión 3d, ingeniería.
Claudia de Paz	Canva, BeFunky.	Comunicación, diseño gráfico.
Ibrahim Aharrar	Fusion360.	Ingeniería, aerodinámica.

Descripción de roles

- Coordinador del equipo: Para encontrar un coordinador de equipo que organizase las tareas de la gestión de empresa de RevolutionX, buscamos a una persona con capacidad de liderar y dosificar grandes proyectos en pequeños trabajos elaborados por distintas personas. Estas características las reúne Saúl con creces.
- Gestor del equipo: Como ya se ha mencionado antes, RevolutionX tiene un organizador en cada sector, y, claro está, el gestor de equipo y responsable de ingeniería Martín, desempeña labores distintas a Saul, responsable de la gestión de empresa. Martín, junto a herramientas como Antigravity, ha diseñado nuestra página web.
- Estrategia, ingeniería & diseño: Martina cumple estas expectativas con creces. Además de haber ayudado a los ingenieros a hacer pruebas de simulación, ella ha sido la responsable de contactar con empresas externas que pudiesen ser posibles patrocinadoras, además de contactar con medios de comunicación como RTVE, El Mundo o El Español.
- Ingeniero de diseño: Víctor lleva dos años siendo el ingeniero de diseño de RevolutionX, y ya se consolidó como uno de los mejores de la competición el año pasado, donde creó el coche Entry más rápido de España.

RACI Y PLAN DE COMUNICACIÓN



Gráfico RACI

El RACI (Responsible, Accountable, Consulted & Informed) es una tabla que permite visualizar como ha participado cada persona del equipo en todas las tareas. Nuestro RACI, está modificado habiendo solo tres categorías, responsable, informado y aislado.

		TABLA DE GESTIÓN			
		Equipo de ingeniería	Equipo de marketing	Diseñador gráfico	Equipo de proyectos
PATROCINIOS	Patlabon		Rp	Inf	Inf
	Traves	A	Inf	Inf	Rp
	Morita	A	Rp	A	Rp
	Quic & Vitor	Inf	Inf	Inf	Inf
	Larena Solutions	Rp	Inf	Inf	Inf
	Artis Magalhães	Inf	Inf	A	Rp
INGENIERÍA	Proyecto table	Inf	Inf	A	Inf
	Coche	Rp	Inf	Inf	Inf
	Impresora PLA	Rp	A	Inf	Inf
	Impresora CNC	Rp	Inf	Inf	Inf
	Regimen del coche	Rp	A	A	Rp
	Reservado	Rp	Inf	Rp	Inf
PUBLICIDAD	Escuadra	Rp	A	A	Rp
	Simuladores	Rp	Inf	Rp	Inf
	Tonel de viento	Rp	Inf	Inf	Inf
	Financiación coche	Inf	Rp	Inf	Rp
	Financiación tonel	Rp	Inf	Inf	Rp
	Carteles principales	Inf	Inf	Rp	Inf
DOCUMENTOS	Cartel grande	Inf	Inf	Inf	Inf
	Cartel Nova Alliance	A	A	A	Inf
	Alocucao reservado	Inf	A	Inf	Inf
	Camisetas	Inf	Rp	Inf	Rp
	Mapas decorativos	Inf	A	Inf	Inf
	Libros	Rp	A	Inf	A
	Politos	Inf	Rp	Inf	Inf
	Plego	Inf	Rp	Inf	Inf
	Financiación	Inf	Rp	Inf	Rp
	Real-ito	Inf	A	Inf	Inf
	Portafolio de Empresa	A	Rp	Inf	Inf
	Portafolio de ingeniería	Rp	Inf	Inf	Inf
	Presentación virtual	Inf	Rp	Inf	Inf
	Cronograma de Gantt	Inf	Inf	Inf	Rp
	Lista de gestión	Inf	Inf	Inf	Rp
	Presupuesto	Inf	Inf	Inf	Rp

CLAVE	SIGNIFICADO
Rp	Responsable
Inf	Informado
A	Aislado

Identificación de stakeholders

Un stakeholder es cualquier persona, grupo u organización que tiene interés o se ve afectado por un proyecto. Es imprescindible identificar cuáles son los stakeholders de tu proyecto para una mejor comunicación.

Este mismo fue el primer paso del equipo para la estrategia de comunicación, identificar todos los stakeholders del equipo. Tras un pequeño trabajo de investigación y análisis, llegamos a la conclusión de que teníamos 9 stakeholders: los coordinadores del equipo, los miembros del equipo, nuestro mentor, la prensa, los jueces de la competición, nuestros seguidores, los miembros de Nova Alliance (nuestra alianza internacional) y Owla (cofundadores junto a nosotros de Nova Alliance).

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

HERRAMIENTA	STAKEHOLDERS	FRECUENCIA
WhatsApp	Miembros del equipo, coordinadores, patrocinadores.	Diaria
Telegram	Miembros del equipo, coordinadores, mentor, Owla.	Semanal
Instagram	Seguidores, patrocinadores, miembros de Nova Alliance.	Mensual
Gmail	Miembros del equipo, coordinadores, mentor, patrocinadores.	Semanal

Plan de comunicación

RevolutionX ha diseñado un plan de comunicación en el que se aclara que tipo de relación vas a tener con cada stakeholder.

TIPO	STAKEHOLDER	INFORMACIÓN COMUNICADA
Interna	Miembros del equipo	Datos del proyecto, cronogramas, alcance, presupuesto.
Interna	Coordinadores	Datos del proyecto, cronogramas, alcance, presupuesto.
Interna	Mentor	Datos del proyecto, alcance, presupuesto.
Externa	Patrocinadores	Datos del proyecto, presupuesto
Externa	Owla	Datos y gestión de Nova Alliance
Externa	Miembros de Nova Alliance	Datos de Nova Alliance
Externa	Seguidores	Publicaciones de Instagram

STAKEHOLDER	FRECUENCIA
Miembros del equipo	Diaria
Coordinadores	Semanal
Mentor	Semanal
Patrocinadores	Trimestral
Owla	Mensual
Miembros de Nova Alliance	Mensual
Seguidores	Mensual

GESTIÓN DE RIESGOS Y MONITOREO



Gestión de riesgos

Uno de los mayores retos que hemos tenido este año como equipo ha sido identificar nuestros riesgos y errores y cómo asesorarlos adecuadamente. Para ello, hemos previsto los errores con antelación, planificándonos con un buen margen tanto de tiempo como de presupuesto para solventar con rapidez posibles contratiempos.

Estos riesgos, naturalmente, han influido en todas nuestras áreas, desde la fabricación del coche hasta el pit display.

INGENIERÍA

- Protección del coche: Riesgo identificado: Posible rotura del coche antes de la competición. Solución: Comprar un maletín acolchado.
- Medidas de las pegatinas: Riesgo identificado: Posible falta o exceso de medidas de las pegatinas en el coche. Solución: Comprobar medidas en Fusión 360 y usar varios bocetos con distintas medidas.
- Impresión del coche: Riesgo identificado: Posible rotura del coche durante el fresado en CNC. Solución: Tener un diseño en impresora 3D de repuesto.
- Simulaciones: Riesgo identificado: No tener las simulaciones listas para el Porfolio de Ingeniería. Solución: Priorizar las simulaciones a otras tareas más secundarias.

Marketing y Pit Display

- Patrocinadores: Riesgo identificado: No tener suficientes patrocinadores para la competición. Solución: Recurrir a patrocinadores más cercanos y fáciles de conseguir para asegurar una buena identidad de marca.
- Difusión de nuestra marca: Riesgo identificado: No difundir suficientemente nuestra marca como para ser reconocidos. Solución: Resaltar más nuestro logo en el pit display, salir en periódicos conocidos y apuntarnos a eventos de STEM Racing (Cupra City Garage, etc.)
- Presupuesto: Riesgo identificado: No tener suficiente dinero para el proyecto. Solución: Llevar un presupuesto organizativo con el dinero del que disponemos y el que necesitamos para una mayor planificación (véase pág. 9).
- Fecha límite elementos: Riesgo identificado: No tener todos los elementos del pit display a tiempo. Solución: Pedir los elementos lo antes posible para tener un margen de tiempo si había errores de impresión.
- Resolución de imágenes en carteles: Riesgo identificado: Baja resolución de los carteles impresos. Solución: Pedir opinión de la empresa que nos imprime los carteles para ajustarlos si hay algún problema.

MONITOREO Y CONTROL

Registro de riesgos: Impacto y probabilidad. Monitoreo y control.

Un informe de estado es un control mensual de las tareas realizadas y las que faltan por realizar, llevando así una organización constante del proyecto.

Informes de estado

Nuestro coordinador de empresa ha estado haciendo un informe de estado mensual:

	INFORME DE ESTADO	
	ingeniería	Marketing
Octubre	Túnel de viento en diseño. Diseño de los primeros prototipos del coche.	Contrato con antiguos patrocinadores. Conseguimos el patrocinio de Triames. Post de Instagram aumentando su alcance.
Noviembre	Prueba de los prototipos del coche y nuevos diseños. Seguimos con la fabricación del túnel.	Establecimiento. Conseguimos el patrocinio de Black and White. Post de Instagram aumentando su alcance. Actualización de nuestra página web.
Diciembre	Diseño del coche después de varias pruebas. Fabricación del túnel.	Creación de Nova Alliance.
Enero	Fin del diseño del túnel, comienza su impresión. Comienza el diseño del coche.	Conversaciones con la Nova Alliance. Diseño de las partes.
Febrero	Modificaciones del túnel de viento. Simulaciones con el coche. Diseñamos los Roll-Over.	Comienza una cuenta Crowdfunding para la realización del túnel. Conseguimos el patrocinio de Pablos y El Postrecho de tuet.
Marzo	Terminan las modificaciones del túnel de viento. Pedimos los Roll-Over para el evento. Terminan el diseño del coche y lo imprimen para el evento del 6 de abril.	Seis meses los pedis para el evento del Cupra City Garage. Diseñamos carteles grandes para el Pit Display. Conseguimos el patrocinio de Luneta Soladora y Mónica.
Abril	Entregamos Portfolio de ingeniería. Terminamos con toda la preparación para las competiciones regionales.	Entregamos Portfolio de Empresa. Publicamos los Posts de tuet. Recibimos todo lo necesario para la competición.

Nombre

El nombre del equipo es uno de los primeros pasos que hacer a la hora de desarrollar una identidad de marca. A la hora de decidir el nombre, buscábamos que fuese en inglés, ya que esto nos haría mantener una internacionalidad que haría que, si llegamos a clasificar a unas finales mundiales, no tuviésemos que rediseñar el nombre. Nuestra elección final fue “RevolutionX”.

Este nombre se divide en dos principales partes. La primera es la palabra más pura, “Revolution”. Al elegir esta palabra, jugamos con su doble significado, ya que puede significar revolución en el sentido de modernidad, cambio, o en el sentido de las revoluciones que hacen las ruedas de los coches. Para darle un toque a este nombre, le añadimos al final una “X” mayúscula, la cual le añade al nombre un toque moderno y alternativo.

ESQUEMA DE COLORES

Los colores son muy importantes en toda empresa, ya que son los que hacen que el público te recuerde. RevolutionX dio en el clavo con su esquema de colores: el negro y el dorado. Estos colores representan la elegancia y la profesionalidad y, además, son colores totalmente distinguibles.



NEGRO DE
REVOLUTIONX
#000000



DORADO OSCURO DE
REVOLUTIONX
#AF884C



DORADO CLARO DE
REVOLUTIONX
#EFE598

Logo y lema

Nuestro logo es uno de los elementos gráficos al que más importancia le hemos dado de todo el desarrollo de nuestra identidad, tras muchos bocetos, conseguimos el resultado del que ahora es nuestro logo. Nuestro logo es una circunferencia con forma de neumático con el nombre de nuestro logo situado en medio de la circunferencia. Nuestro logo puede ser encontrado con un fondo negro detrás, o sin fondo alguno.



LEMA


El lema no es un elemento cuya necesidad sea máxima a la hora de desarrollar una identidad, sin embargo, nosotros queríamos un lema para que nuestros valores fuesen aún más representados. Nuestro lema es “driven by purpose, defined by success”.

Lo primero a tener en cuenta de este lema, es que está en inglés, esto es debido a nuestra intención ya mencionada anteriormente, es mantener al equipo internacionalizado por la posible clasificación a unas finales internacionales.

Uniformes

A la hora de decidir el diseño de nuestros uniformes, buscamos algo simple pero representativo de nuestra marca. La primera decisión fue que tipo de camiseta queríamos. La decidida fue el polo, ya que lo encontramos como la opción que combina mejor la profesionalidad con la comodidad.

En cuanto al diseño, como ya se ha dicho, hicimos un diseño simple, negro con rayas doradas en los hombros. Es importante tener en cuenta que las camisetas las hicimos con una empresa que nos patrocinador, por lo que nos hizo el servicio de manufactura gratis.



MARKETING Y EJECUCIÓN

Objetivos de marketing

Antes de empezar con la ejecución de proyectos de marketing, nuestro primer paso fue establecer los objetivos que queríamos cumplir con cada tarea. Esto hizo que nuestras tareas estuviesen mucho más focalizadas en cumplir los objetivos, y que no nos desviáramos del camino.

- 1. Dar visibilidad a nuestro proyecto
- 2. Dar a conocer STEM Racing
- 3. Colaborar con otros equipos de la competición
- 4. Colaborar con sponsors

OBJETIVOS DE AUDIENCIAS

OBJETIVO	CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS ESPERADOS
Estudiantes	Edad: 11-19 · Chicos & chicas · Uso de redes sociales · Lenguaje coloquial	Aumento en la participación en STEM Racing
Público general	Edad: cualquiera · Chicos & chicas · Internacional · Lenguaje formal	Aumento en nuestra visibilidad
Posibles sponsors	Edad: 25+ · Chicos y chicas · Lenguaje formal	Aumento en nuestros recursos
Escuderías de STEM Racing	11-19 · Chicos & chicas · Lenguaje coloquial	Comunidad de escuderías en la que compartir dudas y visibilidad

EMBUDO DE MARKETING


- Fase 1 — Conciencia. El objetivo es ampliar el alcance del equipo y generar notoriedad entre el público potencial.
- Fase 2 — Consideración. El público ya conoce el proyecto y comienza a interactuar con él de forma orgánica, siguiendo al equipo en redes sociales.
- Fase 3 — Fidelidad. El público se ha convertido en seguidor activo del equipo: interacciona con el contenido de forma regular y tiene un conocimiento profundo del proyecto.

Instagram y página web

Instagram es la red social que usa RevolutionX para hacer publicaciones promocionándonos a nosotros mismos y a Sponsors. Además, también la usamos para comunicarnos con empresas para mandarles nuestro prospecto de patrocinio. Además, gracias a esta plataforma, hemos conseguido crear nuestra alianza internacional la cual hablaremos más adelante.



Nuestro coordinador de ingeniería diseñó una página web la cual usamos para dar información del equipo y de nuestros Sponsors.



Nova Alliance y difusión

Junto con el equipo español Owla, hemos creado un proyecto, que, aunque todavía esté en desarrollo, es importante mencionar en este porfolio. Hemos creado Nova Alliance, una alianza internacional en la que participamos equipos de STEM Racing de todo el mundo.

El objetivo de esta alianza es ayudarnos mutuamente y consultarnos dudas y darnos visibilidad entre todos. Actualmente, en esta alianza estamos los siguientes equipos:

REVOLUTIONX (ESPAÑA)


OWLA (ESPAÑA)

BUFFALO SIX (MÉJICO)

TEAM STEALH (GALES)

VIELOX (VIETNAM)

APEX ELEGANCE (CHINA)



JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Durante la jornada de puertas abiertas de nuestro centro, donde vinieron muchos niños a ver nuestras instalaciones y programas educativos, tuvimos la oportunidad de presentar nuestro equipo de STEM Racing a los niños.

PATROCINIO, PRENSA Y CROWDFUNDING

Prensa y visibilidad

Nuestra responsable de estrategia, ingeniería y relaciones externas logró, a base de diversas comunicaciones con diversos periódicos, establecer comunicaciones con una periodista de EL MUNDO, la cual, tras muchos días en los cuales nos preguntaba por información del equipo, publicó un artículo de RevolutionX en la sección de GranMadrid del periódico diario.

Tras esta aparición en la prensa, otros medios de comunicación mostraron interés en nuestro equipo y proyecto, así que un día, les invitamos a una presentación en la cual pudieron hacernos preguntas.

RevolutionX sale en los siguientes medios de comunicación: EL MUNDO, RNE, El Español, InfoMajadahonda, Noroeste Madrid & Majadahonda Magazine y más.



VISITA DE LA ALCALDESA DE MAJADAHONDA

El pasado 24 de febrero, Lola Morena, la alcaldesa de Majadahonda vino, junto a varios medios de comunicación y Cristina Benzal(directora de Fórmula MadCup - STEM Racing Spain) a visitar a nuestro instituto y le hicimos una presentación en la que hablamos sobre nuestro equipo, y STEM Racing.

Tras esta reunión, el ayuntamiento del municipio se ofreció a patrocinarnos.



Patrocinio

Actualmente, RevolutionX goza de: 4 patrocinadores de recursos monetarios - 625€. Pañalón. Lorena Solutions. Moñita. Titanes. El postrecito de Isabel. 3 patrocinadores de recursos materiales – 10 uniformes + 3 roll ups. Black & White. Ayuntamiento de Majadahonda. El postrecito de Isabel.

ESTRATEGIA DE PATROCINIOS

Como ya ha sido mencionado antes, el equipo hizo una estimación de presupuesto y llegó a a la conclusión de que necesitábamos 1000€ para cubrir todos nuestros gastos. La primera idea y más obvia, fue la de conseguir este dinero a base de patrocinadores, por lo que nos pusimos manos a la obra.

CAPTACIÓN DE PATROCINADORES

Nuestro método de captación de patrocinadores se basó en tres pasos. El primero fue mandarle el prospecto de patrocinios a todas las empresas posibles. Durante este paso, la mayoría de las empresas, o bien no contestaban, o bien nos hacían saber que no estaban interesadas en colaborar con nosotros.

El segundo paso se basó en mantener relaciones con los patrocinadores, en las cuales hablábamos sobre nuestro proyecto, que recursos necesitábamos, etc. Cuando las empresas nos confirmaban acuerdo de patrocinio con nosotros, pasábamos al último paso. El último paso fue la confirmación de patrocinio. En este paso oficializábamos públicamente nuestro acuerdo de patrocinios con la respectiva empresa.

ROI Y CONTRAPRESTACIONES EN PRÁCTICA

El ROI (Return on Investment) o Retorno de Inversión es una métrica que mide cuánto beneficio obtienes con relación a lo que has invertido. El tamaño de los logos en todos estos elementos se basó en cuánto había aportado cada empresa. Esto se puede observar notoriamente con el logo de Pañalón, esta empresa nos aportó 250€, nuestro ingreso más grande por parte de patrocinadores.



Crowdfunding

Debido a que vimos que únicamente con el dinero obtenido por los patrocinadores no nos iba a llegar para poder cubrir todos los gastos del presupuesto esperado, y que el proceso de búsqueda de más Sponsors era muy largo y costoso, buscamos alternativas para recaudar fondos de otra manera.

Después de un brain storming dimos con la clave, un crowdfunding. Al día siguiente de tener esta idea, y después de un tiempo, RevolutionX lanzó su propio Crowdfunding en la plataforma GoFundMe, donde pedíamos a la gente 1000€.

Los resultados fueron casi inmediatos, y aunque no conseguimos los 1000€ pedidos, conseguimos el dinero suficiente para poder cubrir todos nuestros gastos: 625€.

